


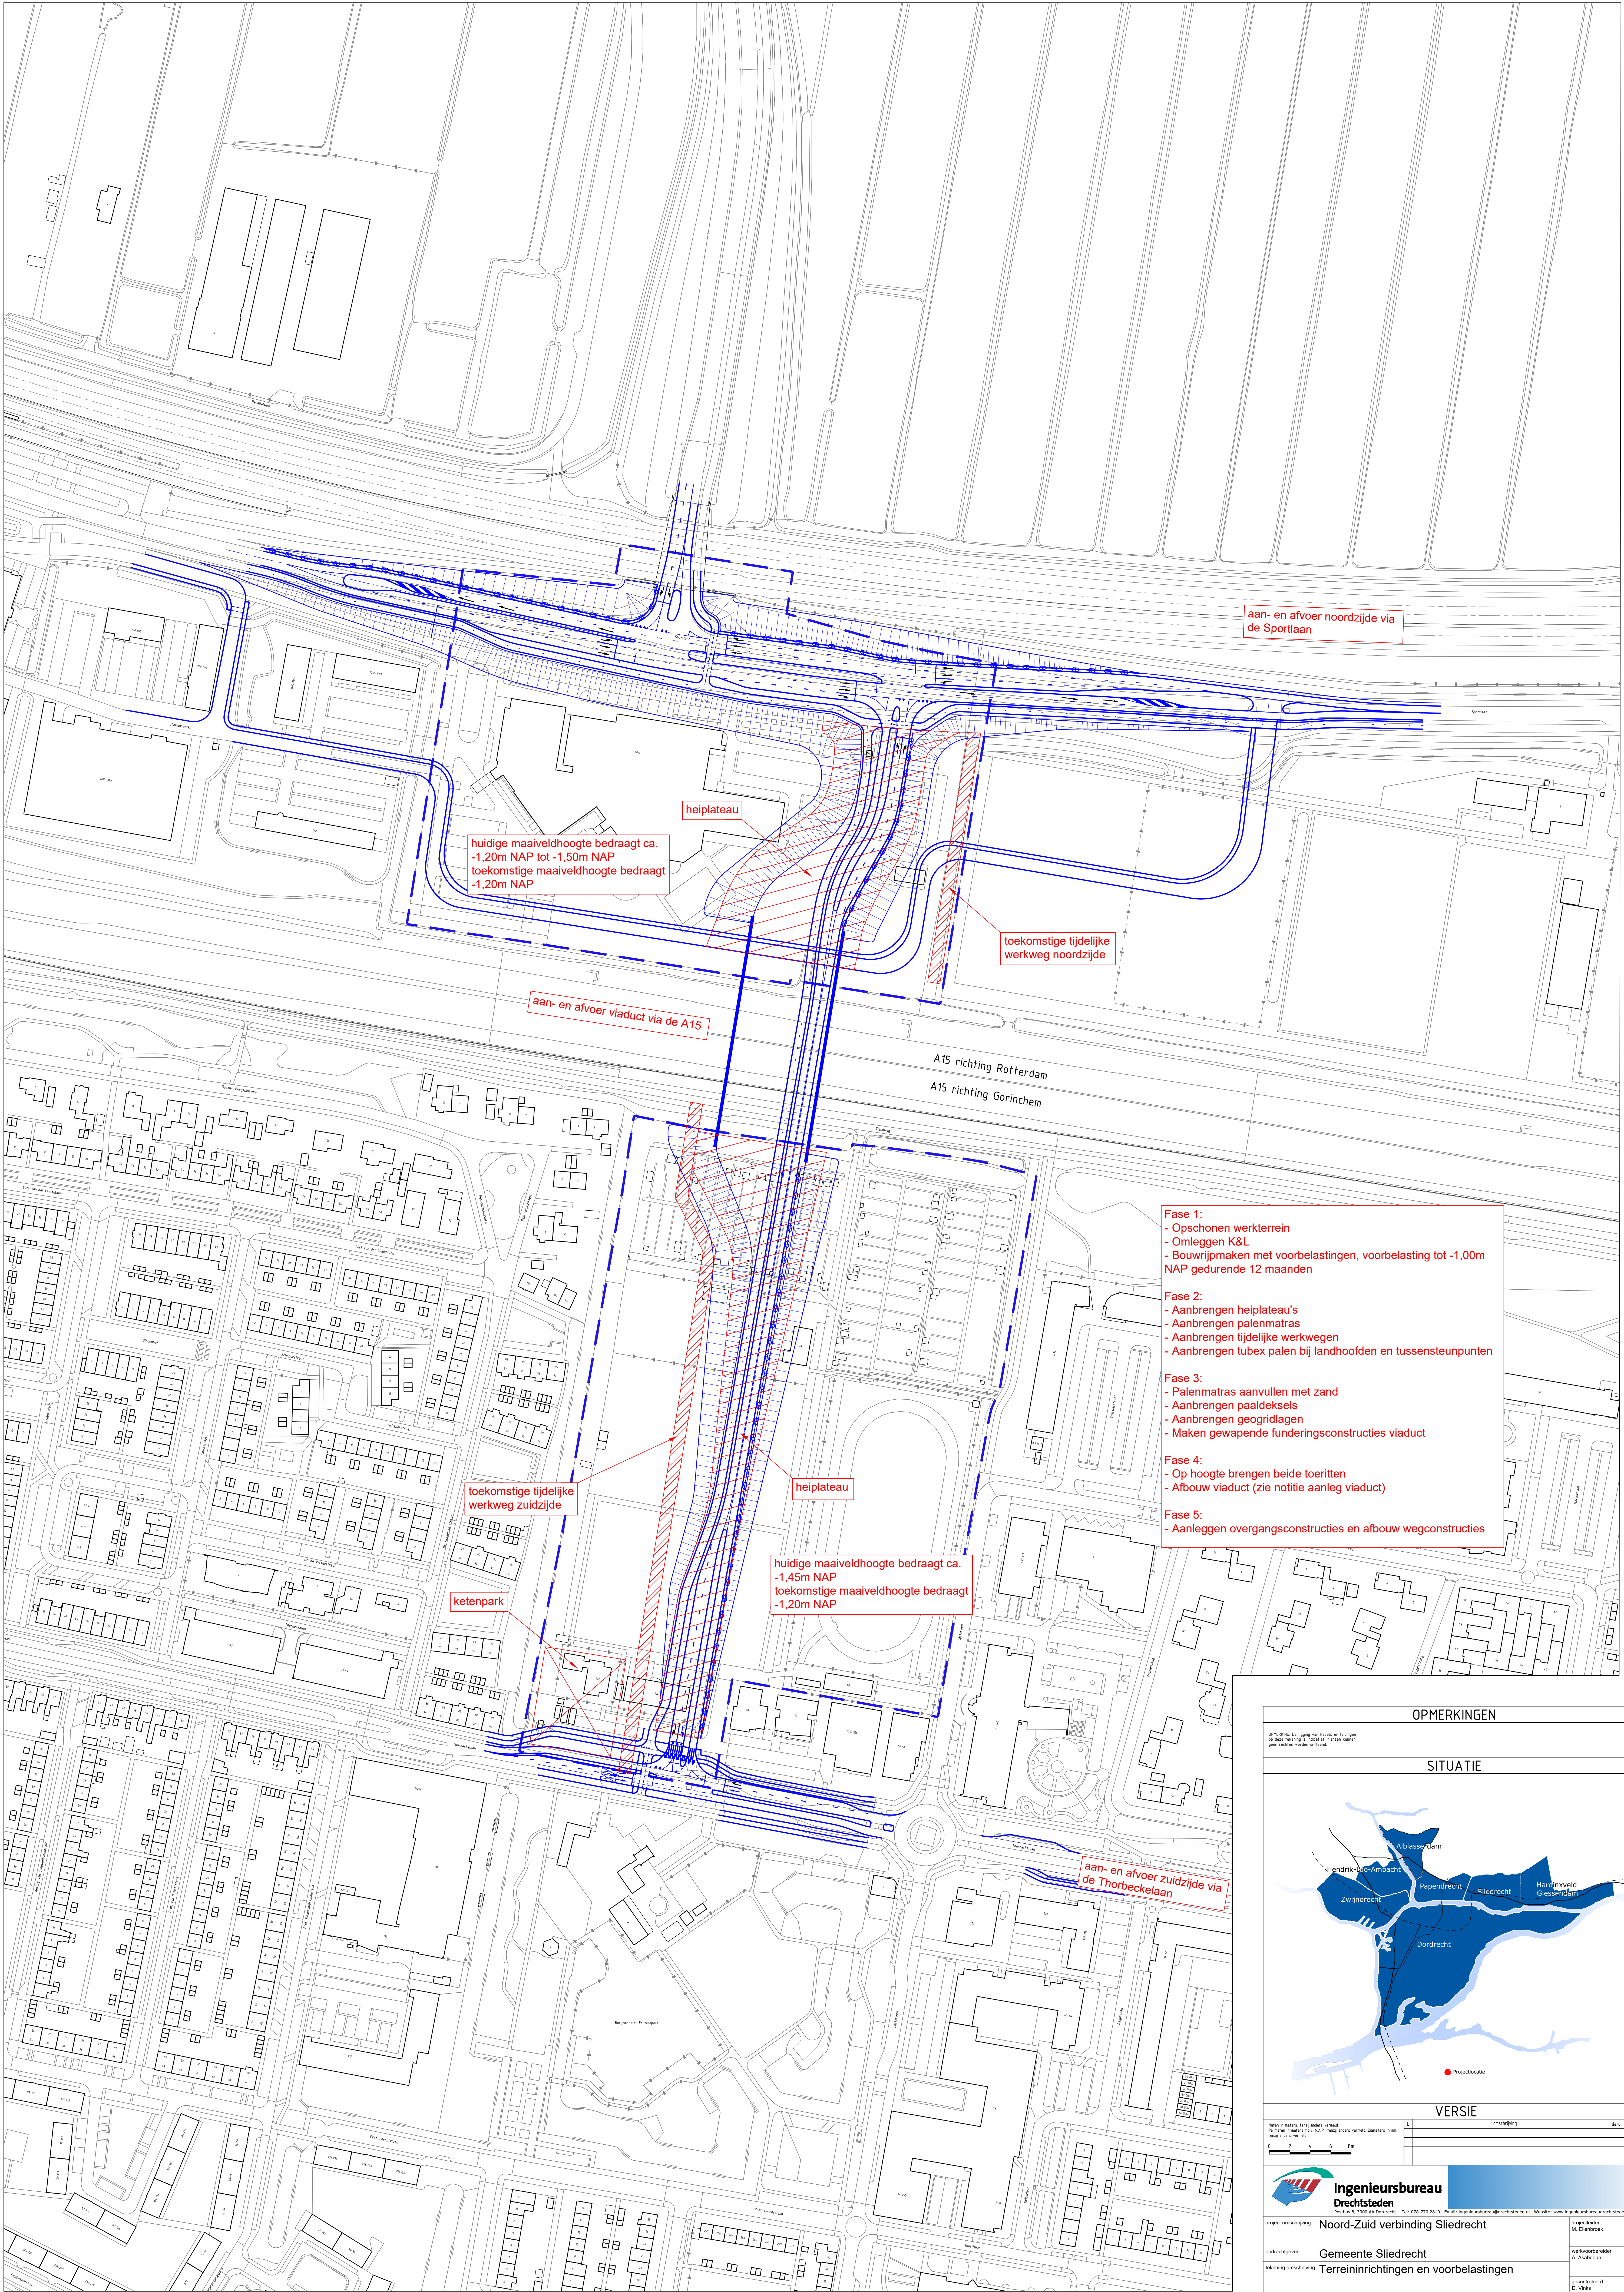

Situatie
SCHAAL 1 : 1000

- Fase 1:**
- Opschonen werkteerrein
 - Omleggen K&L
 - Bouwrijmmaken met voorbelastingen, voorbelasting tot -1,00m NAP gedurende 12 maanden
- Fase 2:**
- Aanbrengen heiplateau's
 - Aanbrengen palenmatras
 - Aanbrengen tijdelijke werkwegen
 - Aanbrengen tubex palen bij landhoofden en tussensteunpunten
- Fase 3:**
- Palenmatras aanvullen met zand
 - Aanbrengen paaldeksels
 - Aanbrengen geogridlagen
 - Maken gewapende funderingsconstructies viaduct
- Fase 4:**
- Op hoogte brengen beide toeritten
 - Afbouw viaduct (zie notitie aanleg viaduct)
- Fase 5:**
- Aanleggen overgangsconstructies en afbouw wegconstructies

OPMERKINGEN

OPMERKING: De ligging van labels en tekeningen op deze tekening is indicatief. Het kan voorkomen dat de tekening anders wordt afgedrukt.

SITUATIE

VERSIE

versie	omschrijving	datum
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

Ingenieursbureau Drechtsteden

Project omschrijving: Noord-Zuid verbinding Sliedrecht

Opdrachtgever: Gemeente Sliedrecht

Tekening omschrijving: Terreininrichtingen en voorbelastingen

Fase: SO

Besteknummer: 3125

Formaat: A0

Schaal: 1:1000

Tekeningnummer: 3125-06

Datum: 20-01-2020

Wijziging:
